

# 建筑施工安全监督限期整改通知书

迁建[安]限改字第202028号

福建平潭海峡风电工程有限公司

经抽查，你单位施工的 清晖雅园项目一期一标段 项目，违反《安全生产法》、《建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》等法律法规和标准规范，存在如下安全隐患：

存在的问题	违反法律法规、规范标准、规范性文件名称条款
<p>1. 现场存在脚手架顶层前2层未搭设规范                      搭设，外立杆悬空，制定整改方案上报停用脚手架。                      2. 未悬挂首层限网，个别工人高处作业未系安全带，作业层脚手板未</p>	<p>“两会前”安全隐患排查                      补漏</p>

要求你单位对包括但不限于上述问题立即进行整改，举一反三，全数检查，整改完毕后，经施工企业主管部门自查合格，由监理单位组织验收，验收合格确认后形成安全隐患整改报告，经建设、施工、监理单位项目负责人签字并加盖公章，于2020年5月17日前将上述整改报告书报送我监督机构。

签发人： 陈云华     邱明


2020年5月15日


施工单位： 王强

监理单位： 刘立军

建设单位： 王强

注：本通知书一式4份，安监机构、施工单位、监理单位、建设单位各1份

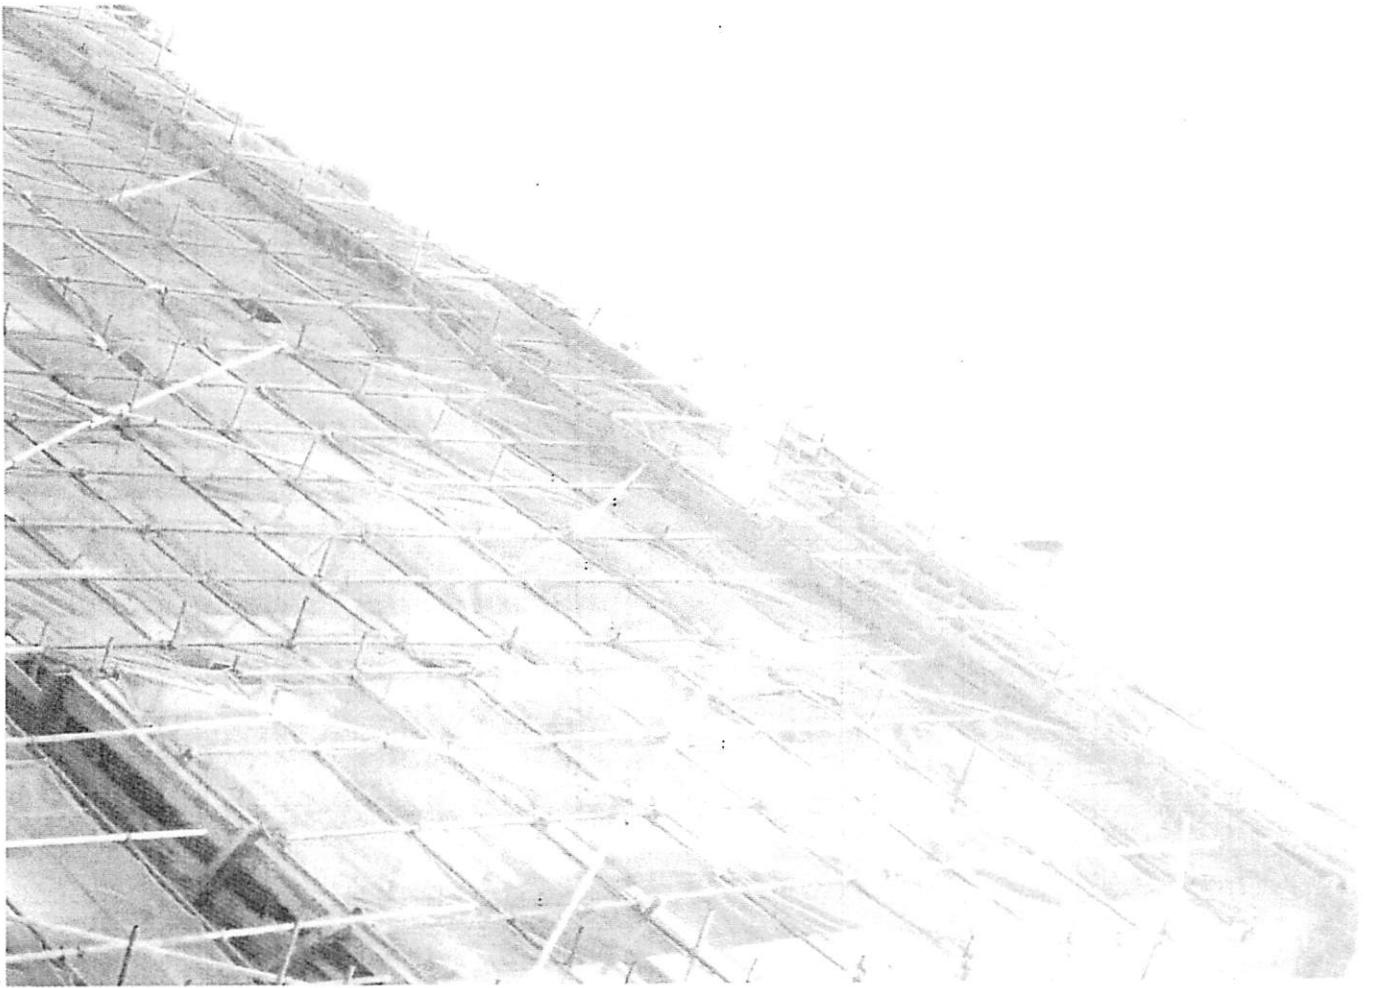


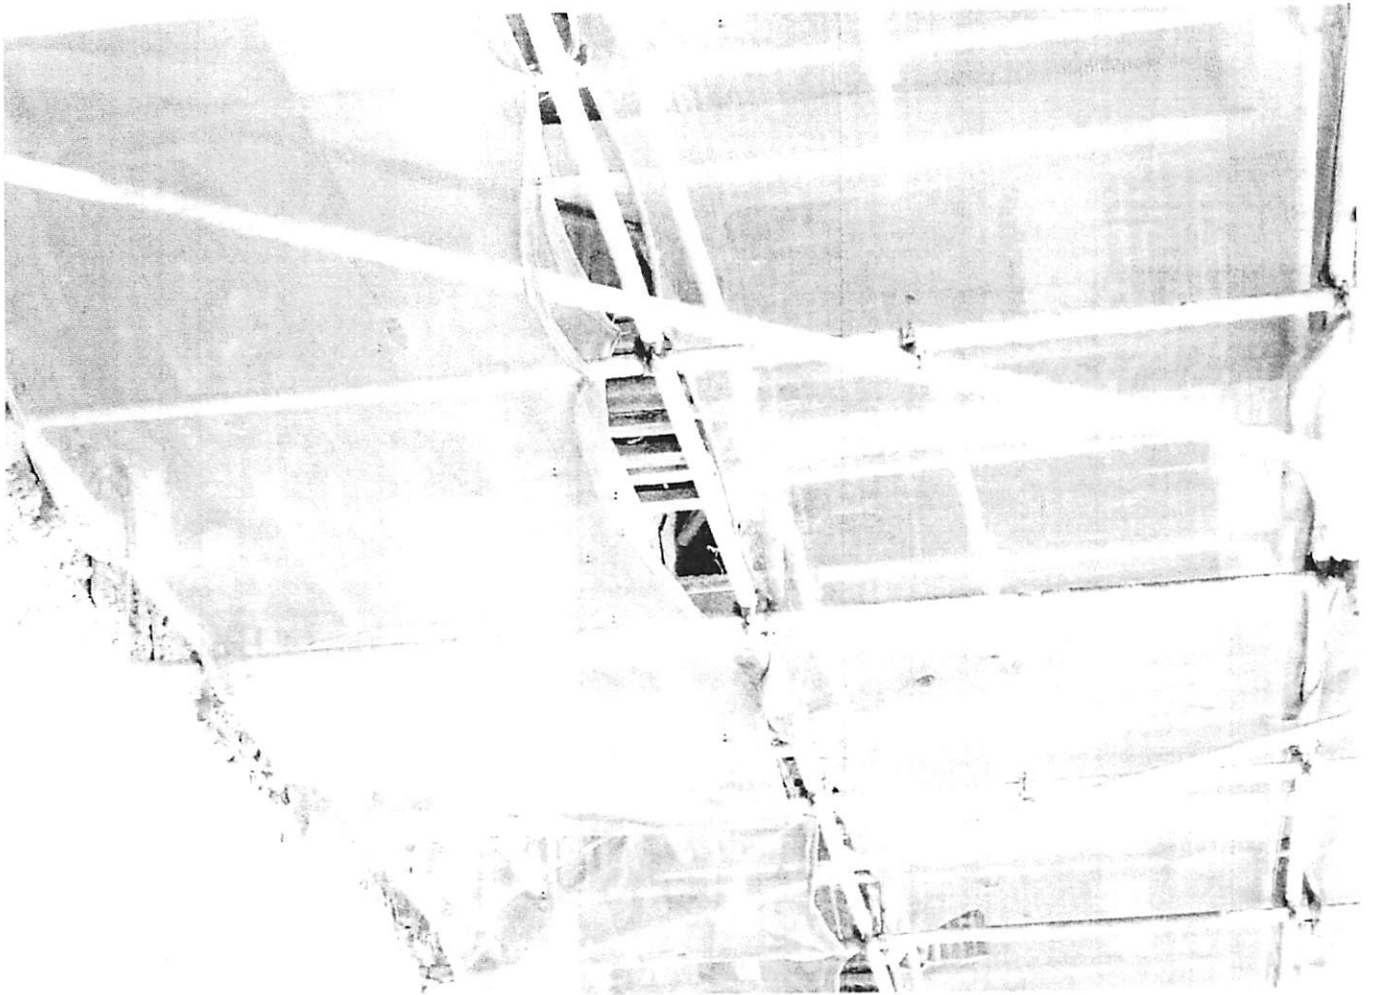



# 建筑施工安全隐患整改报告书


施工单位	迁安市安峻建筑工程有限公司	工程名称	清晖雅园项目一期一标段
通知书编号	迁建【安】限改字第（202023）号		
整改情况	<p>我方接到市安监站安全监督限期整改通知后，立即安排人员按整改要求完成相关工作。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 脚手架顶前 2 层存在外立杆悬空情况，制定了整改方案上报，并已按上报方案搭设；</li> <li>2. 首层漏挂兜网部位已补挂齐全；</li> <li>3. 对检查中发现未系安全带情况已要求现场悬挂，并给予警告。对作业层脚手板漏空部位已铺满脚手板。</li> </ol> <p>项目经理： </p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> <p>施工单位： </p> <p>2020 年 5 月 17 日</p> </div>		
监理单位	<p>监理单位： </p> <p>2020 年 5 月 17 日</p>		
建设单位	<p>建设单位： </p> <p>2020 年 5 月 17 日</p>		

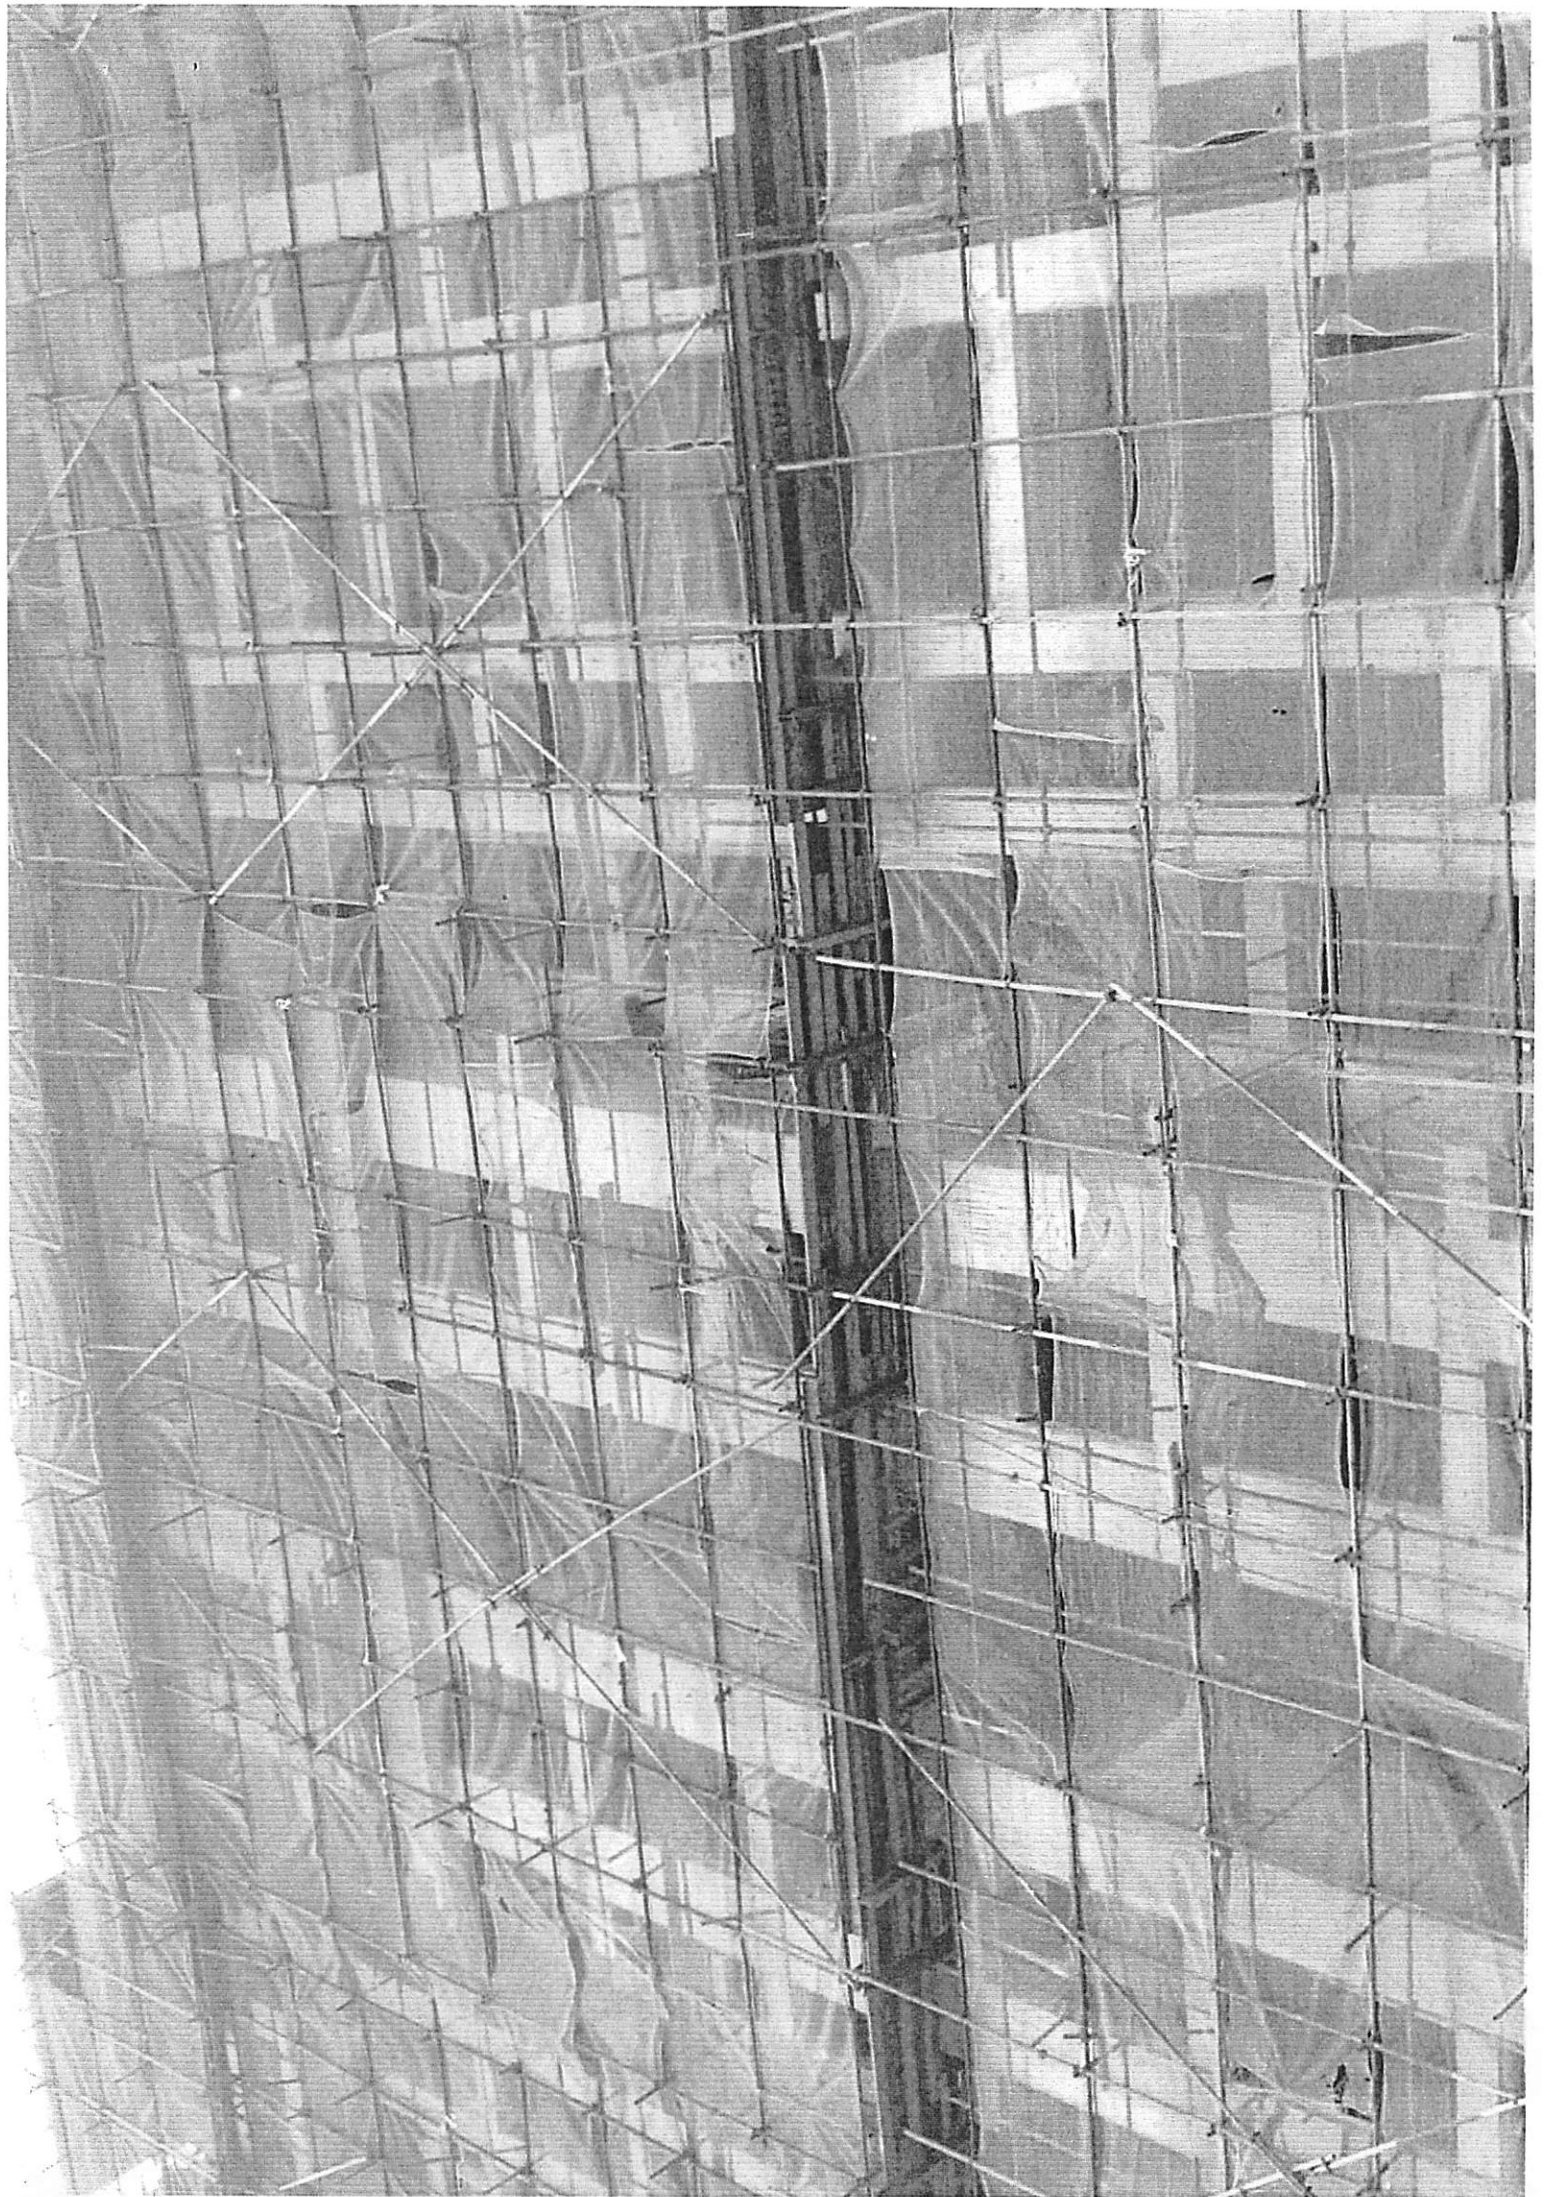







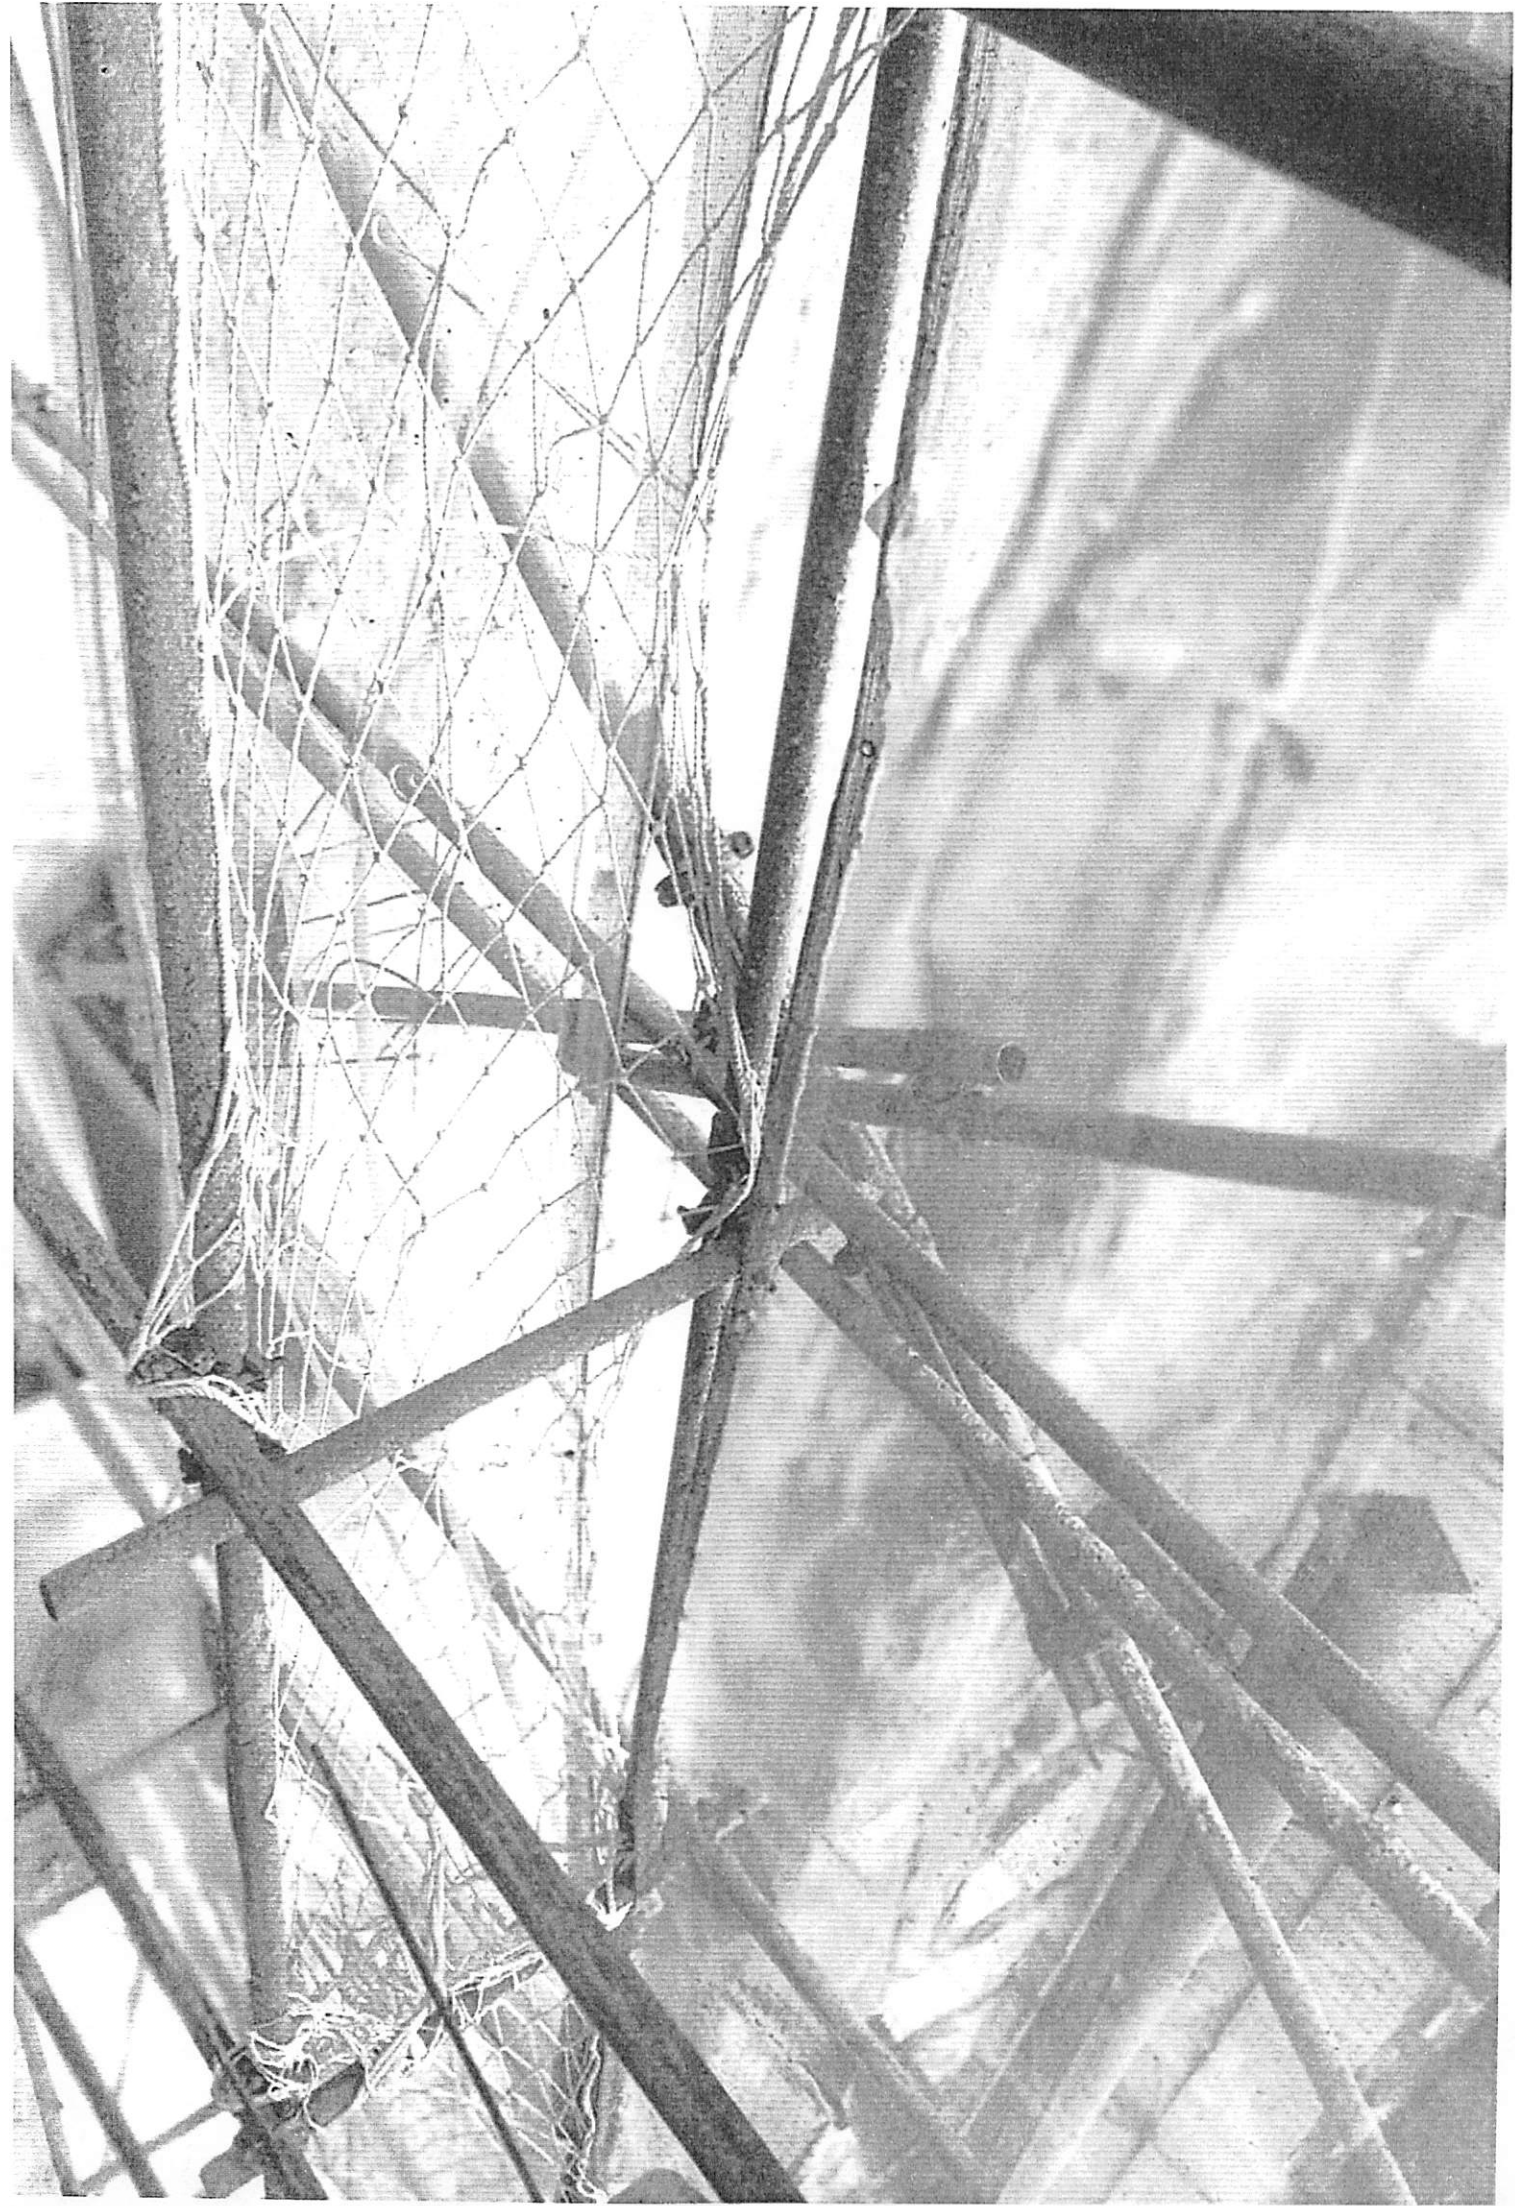


## 脚手架整改方案

1 情况说明：目前清晖雅园一期一标段主体已经全部封顶，脚手架体全部到达主体结构顶部。图纸设计外檐尺寸较大，造成外檐部分脚手架外挑，目前现场利用外伸水平杆作为悬挑杆件，外立杆有悬空现象，此部位架体只用于维护架体，不参与主体承重，特制订如下整改方案。

2 整改方案：1:如图所示，在双箭头细线部位用脚手管做斜支撑，间距随立杆间距。

2: 双曲线所示部位为钢丝绳与主体拉结。

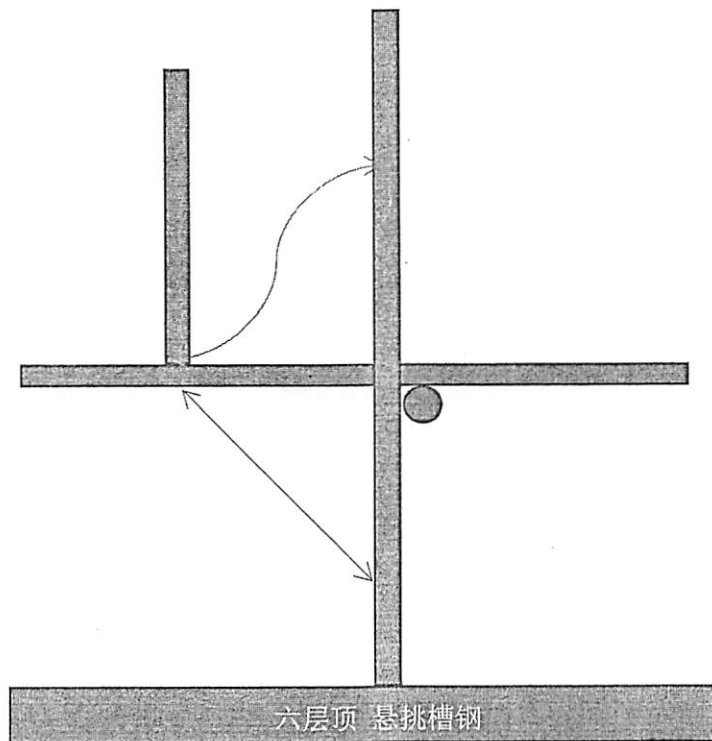

## 建筑施工安全监督记录

项目名称	清晖雅园一期-标段			形象进度	主体
施工单位	唐山市安峻 建设	法人代表	刘玉	联系电话	
		项目经理	张浪	联系电话	
建设单位	唐山恒嘉房地产	现场负责人	马百营	联系电话	
监理单位	河北亿守	现场总监	张宏波	联系电话	
检查时间	2020.5.18	执法人员	郭鹏、吴南		
抽查范围、 部位、内容	对唐山市安峻建设有限公司(202023)号复查。				
检 查 情 况	已按要求整改到位。				



附件：必要的影像资料。

施工单位：王宏峰

监理单位：刘立军

建设单位：马同强
